

Travaux de mise en sécurité des dépôts massifs de scories présents sur le littoral sud des Calanques

Réunion publique du 3 juillet 2026

Sommaire

1. Bilan de la 1^{re} période de travaux

- a. Rappels sur le contexte d'intervention
- b. Travaux réalisés
- c. Surveillance de la qualité de l'air

2. Présentation de la 2^e période de travaux

- a. Bilan et planning général
 - b. Localisation des installations de chantier, des zones de travaux, calendrier et description des travaux
 - c. Modalités pratiques et présentation des mesures d'accompagnement
-

1. Bilan de la 1^{re} période de travaux

Rappels sur le contexte d'intervention

- **Des travaux soumis à des exigences techniques, réglementaires, environnementales et sanitaires particulièrement élevées**, avec de nombreuses mesures de protection à mettre en oeuvre (brumisation, gestion des eaux, protection des espèces, maîtrise des poussières...)
- **Des contrôles réguliers et un suivi rapproché** afin de garantir la conformité des travaux et la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sanitaires
- **Des conditions météorologiques défavorables** au début de l'année 2026, ayant ponctuellement limité l'avancement des travaux
- **Un chantier complexe**, mobilisant plusieurs entreprises et nécessitant une coordination permanente pour garantir la sécurité, la qualité des travaux et le respect des engagements du projet

Travaux réalisés - Bilan

4 ZONES	7 DÉPÔTS		
Calanques de Saména	DSa02	DSa03	DSa04
Carneau de Mauvais Pas	CMPa01	CMPa02	
Port de l'Escalette	DEs01		
Calanque des Trous	DTr01		

- **4 dépôts intégralement** mis en sécurité conformément aux attendus généraux (insertion paysagère...)
- **3 dépôts mis en sécurité partiellement** : travaux à finaliser lors de la 2^e période

Surveillance de la qualité de l'air

Objectif

Pendant toute la durée du chantier, quantifier les émissions de poussières (PM10 et PM2,5 + Plomb et Arsenic sur PM10) et retombées de poussières et leurs concentrations en métaux (Pb et As), afin de s'assurer de l'absence d'impact sanitaire sur les populations

Important !

Les poussières ne proviennent pas uniquement du chantier :

- Circulation routière
- Pollution urbaine
- Feux de végétation, de cheminée...
- Travaux de construction
- Remise en suspension de poussières par le vent
- Sable du Sahara

Résultats – Bilan de la 1re période de travaux

- **Aucun dépassement des seuils de vigilance ou d'alerte pour :**
 - **les PM2,5 et PM10** dans l'air ambiant (préleveur automatique, intégration sur 1 semaine)
 - **l'arsenic et le plomb** dans l'air ambiant (PM10) et dans les retombés de poussières

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site du projet : <https://calanques-de-marseille.ademe.fr/wp-content/uploads/2026/05/ademe-calanques-presentation-comite-suivi-2026-05-19.pdf>

Résultats – Bilan de la 1^{re} période de travaux

Surveillance en temps réel des PM_{2,5} et PM₁₀ :

✓ **17 alertes de vigilance** détectés

- **Chaque alerte a déclenché immédiatement :**

- ✓ Une **analyse des causes**

- ✓ Des **mesures correctives** (principalement un renforcement de la brumisation)

Ce dispositif de surveillance a pleinement joué son rôle : détecter rapidement toute situation inhabituelle et permettre une intervention immédiate

2. Présentation de la 2^e période de travaux

Bilan et planning général



Localisation des installations de chantier et des zones de travaux

Installations de chantier (*en rouge*) au plus près des **zones de travaux** (*en jaune*) entre Saména et Callelongue


- Saména
- Port de l'Escalette
- Vallon de l'Escalette
- Calanque des Trous → alternat de circulation
- Entrée des Goudes → alternat de circulation
- Port des Goudes
- Entrée de Callelongue → alternat de circulation + neutralisation du rond point
- Village de Callelongue

**Base vie principale : Parking Napoléon
(du 1^{er} sept. 2026 au 31 mars 2027)**

2^e période de travaux

9 ZONES	13 nouveaux DÉPÔTS (+ 3 à finaliser)				Durée
Calanques de Saména	DSa03				4 - 5 mois
Port de l'Escalette	DEs01				4 - 5 mois
Calanque des Trous	DTr01				4 - 5 mois
Vallon de l'Escalette	DVEs01	DVEs02	DVEs03	DVEs04	3 - 4 mois
Entrée des Goudes	DGo03				4 - 5 mois
Port des Goudes et Anse de la Maronaise	DGo01	DGo02	DGo05		4 mois
Chemin de randonnée (en face du parking Napoléon)	DGo04				20 jours
Belvédère de Callelongue	DCa01				7 mois
Ch. de rando. de Callelongue	DCa02	DCa03	DCa04		1 mois


Planning de la 2^e période de travaux

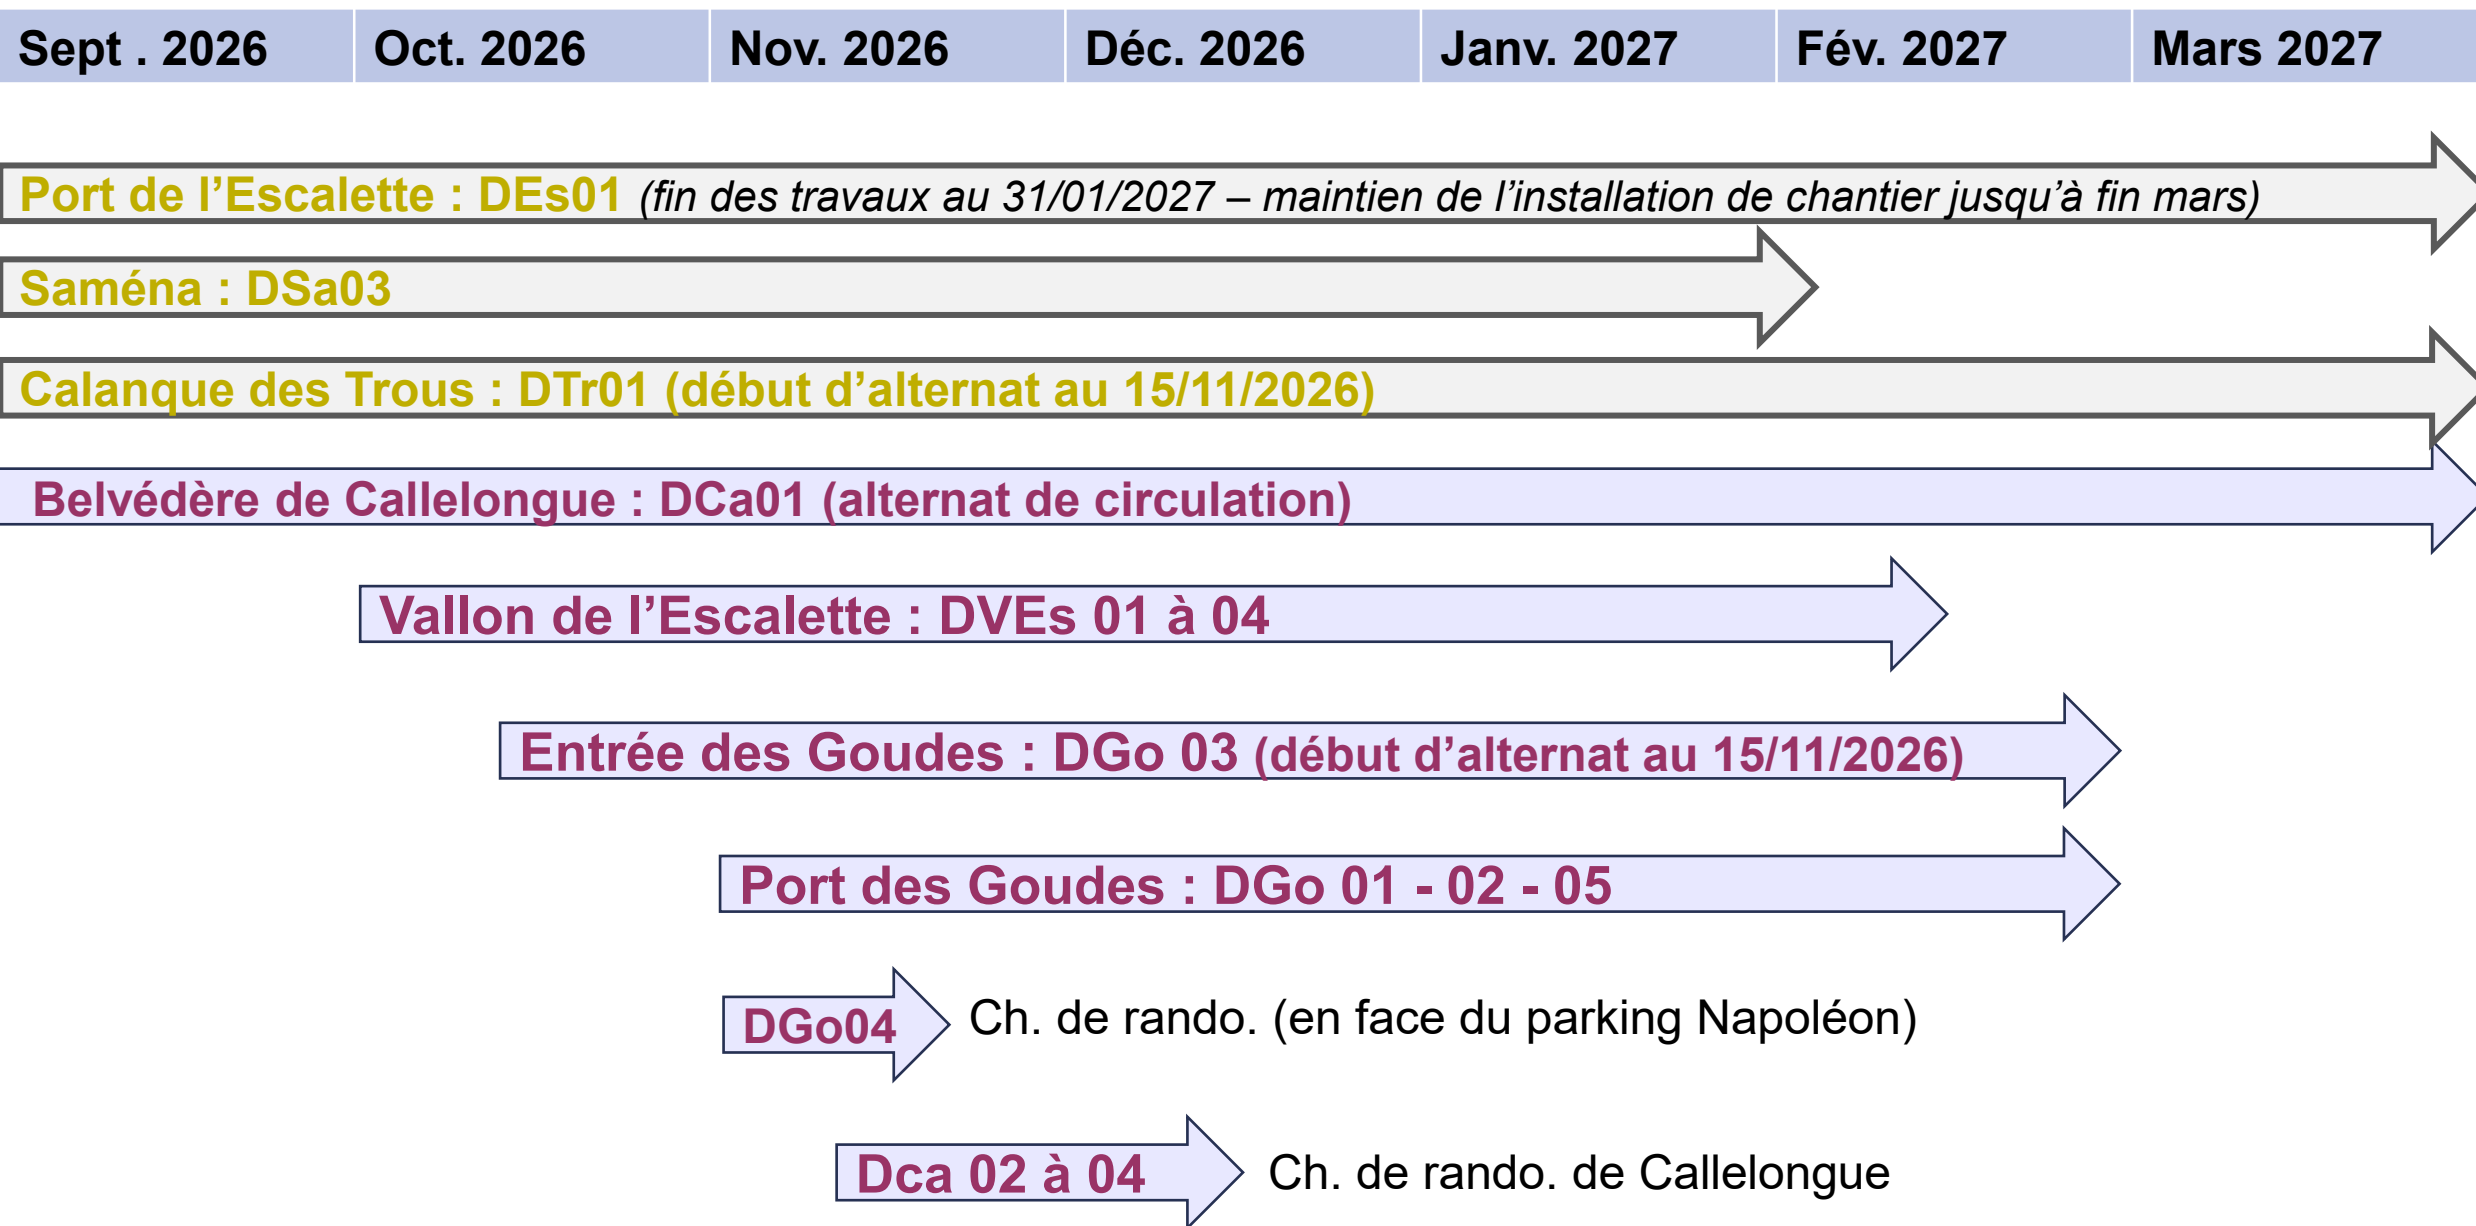

Localisation des installations de chantier, des zones de travaux, calendrier et description des travaux

Base vie principale au Parking Napoléon

- **Extension nécessaire** de la base-vie par rapport à la période 1 (environ 70 intervenants en périodes de pointe)
- **Parking** : en semaine 0 place et le WE 14 places
- **Tente de confinement**
- **Amélioration** des zones de stockage de matériels et vestiaires

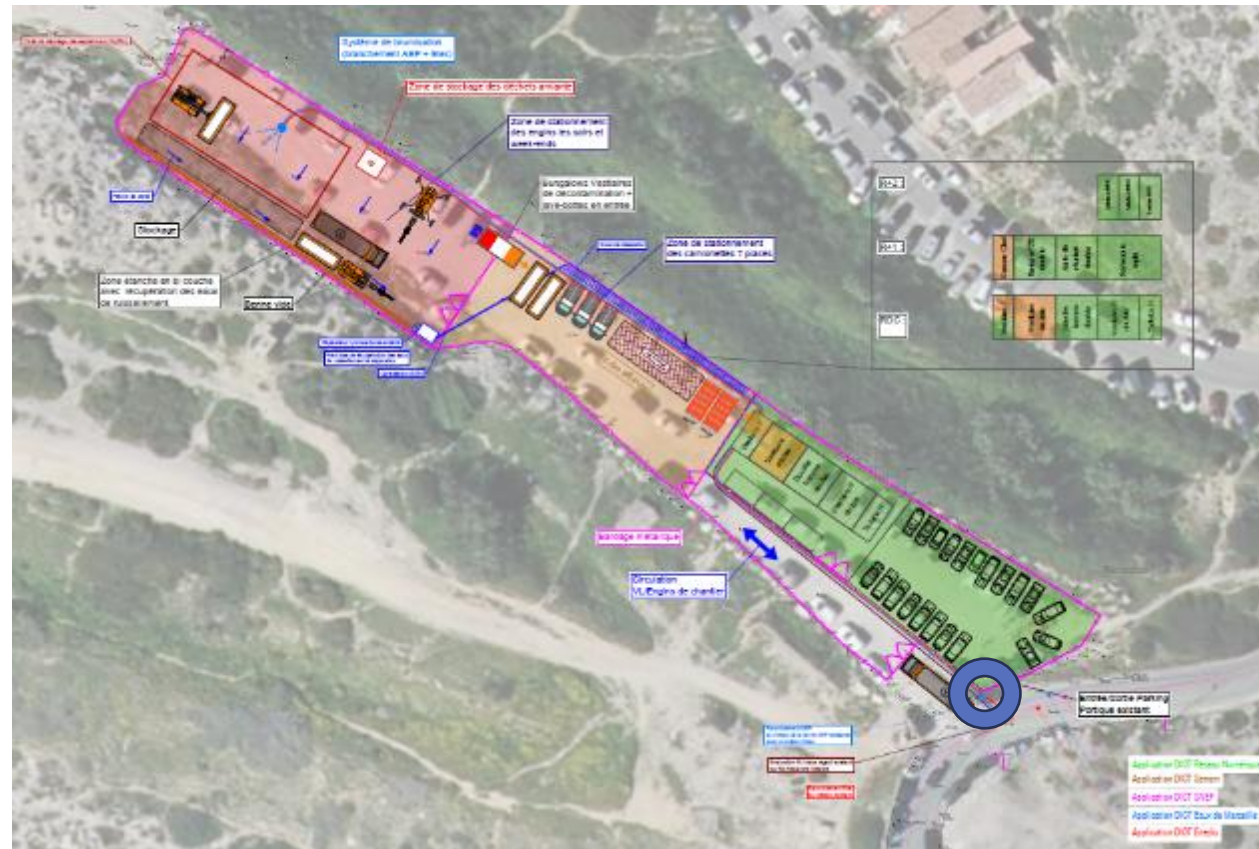


Finalisation - Calanque de Saména (dépôt DSa03)



Calanques de Saména (dépôt DSa03)

- Finalisation des travaux : du 01/09/2026 au 31/01/2027
- A partir du 01/09/2026
 - ✓ Fermeture de la zone de stationnement au niveau des locaux de la SERAM
 - ✓ Fermeture de la rue des Roucaous par le Boulevard de la calanque de Saména
- Reprise intégrale du confinement des restanques
- Remplacement des matériaux de la plage
- Réalisation du parement et des éboulis calcaires sur les restanques
- Les plantations seront réalisées l'année suivante (période de plantation optimale : automne)

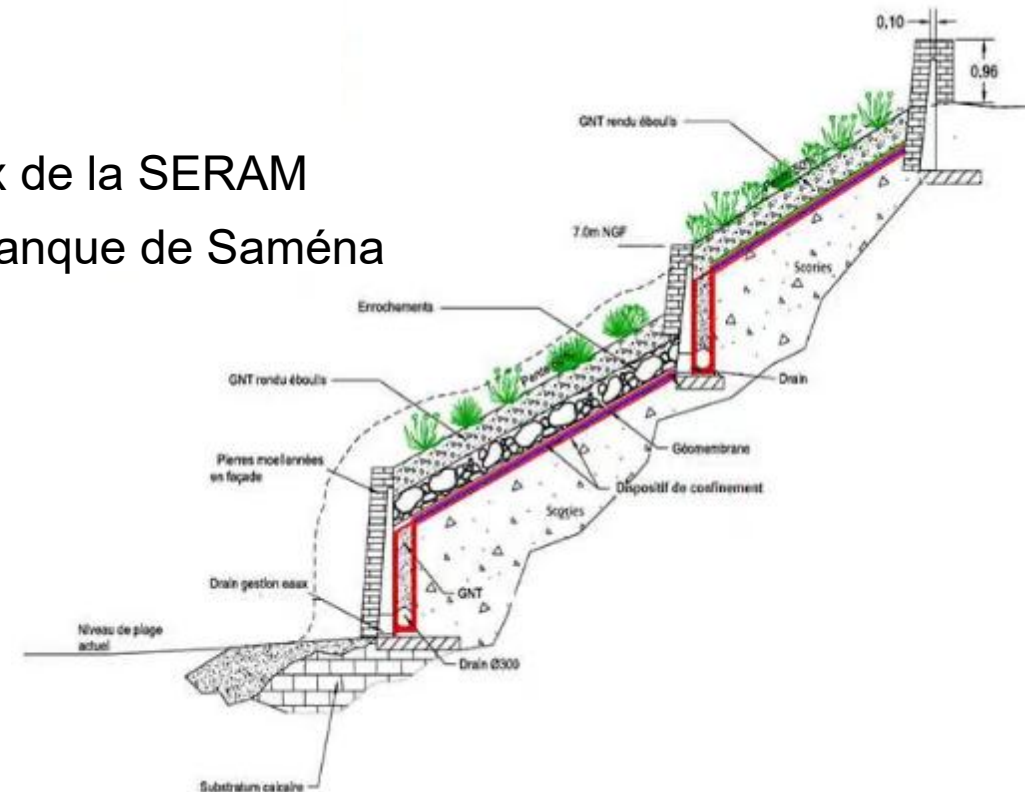

Travaux qui nécessiteront environ 50 camions

Finalisation - Port de l'Escalette (dépôt DEs01)



Port de l'Escalette (dépôt DEs01)




- Finalisation des travaux : **du 01/09/2026 au 31/01/2027**
- Maintien de l'installation de chantier **jusqu'au 31/03/2027**
- Réalisation du parement en pierres et des éboulis (10 camions environ)

Utilisation de la zone comme **installation de chantier secondaire** pour la mise en place du **pont-bascule** et le **stationnement temporaire des camions pour fluidifier le trafic**

Finalisation - Calanque des Trous (dépôt DTr01)



Calanque des Trous (dépôt DTr01)

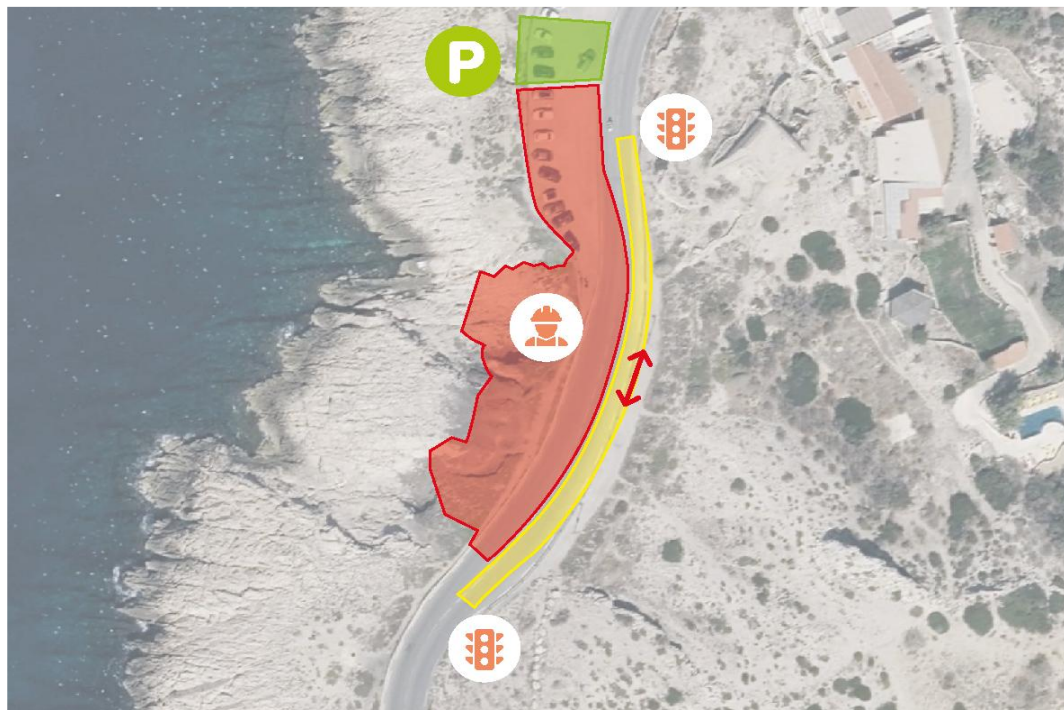


- Finalisation des travaux : **du 01/09/2026 au 30/01/2027**
- Réalisation du parement en pierres sur les 2 ouvrages (jusqu'au 15/11/2026)
- Confinement + éboulis de la partie supérieure du dépôt Nord
- Alternat de circulation nécessaire **à partir du 15/11/2026** (retrait les week-ends)
- 20 à 30 camions environ (transport de pierre...)

Belvédère de Callelongue : dépôt DCa01



Belvédère de Callelongue : dépôt DCa01

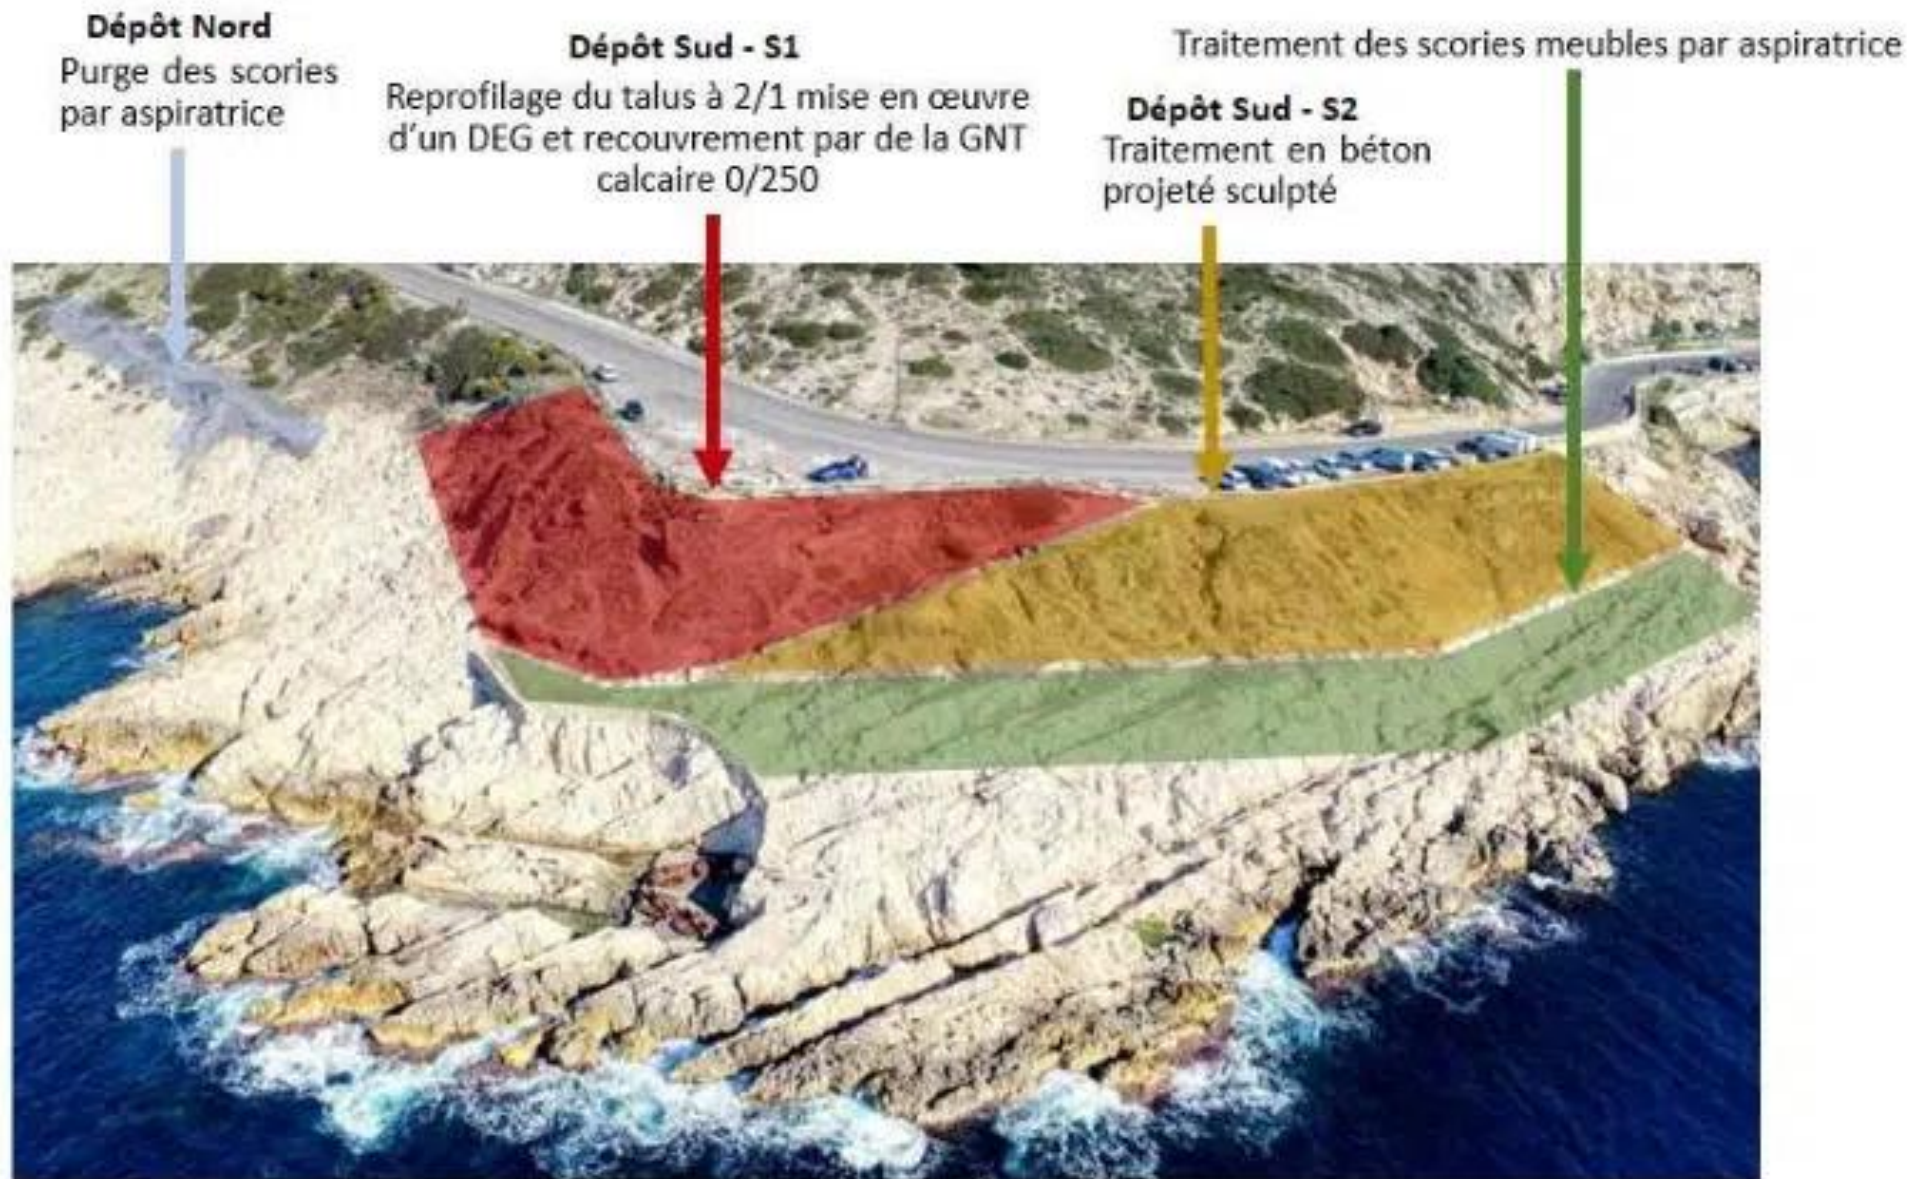

- Travaux prévus **du 01/09/2026 au 31/03/2027**
 - **Purge d'environ 600 m³ de scories** sur le dépôt Nord
 - **Retalutage du dépôt Sud et confinement avec habillage mixte éboulis / **béton projeté sculpté****
 - 300 à 400 camions environ
-
- **Alternat de circulation** nécessaire pendant 7 mois **SANS** retrait possible les week-ends
 - **Neutralisation du rond-point Livanos**
 - Installation de chantier au niveau de la barrière de filtrage **dès le 1^{er} septembre**



Chemin de randonnée de Callelongue : dépôts DCa02-04




- 28

Chemin de randonnée face au parking Napoléon : dépôt DGo04



Chemin de randonnée face au parking Napoléon : dépôt DGo04

- Travaux prévus du **30/10/2026** au **20/11/2026**
- **Purge des scories** : 250 m² sur 30 cm de profondeur et remplacement par de la **grave calcaire**
- **Maintien d'un accès piéton**
- 5 camions environ

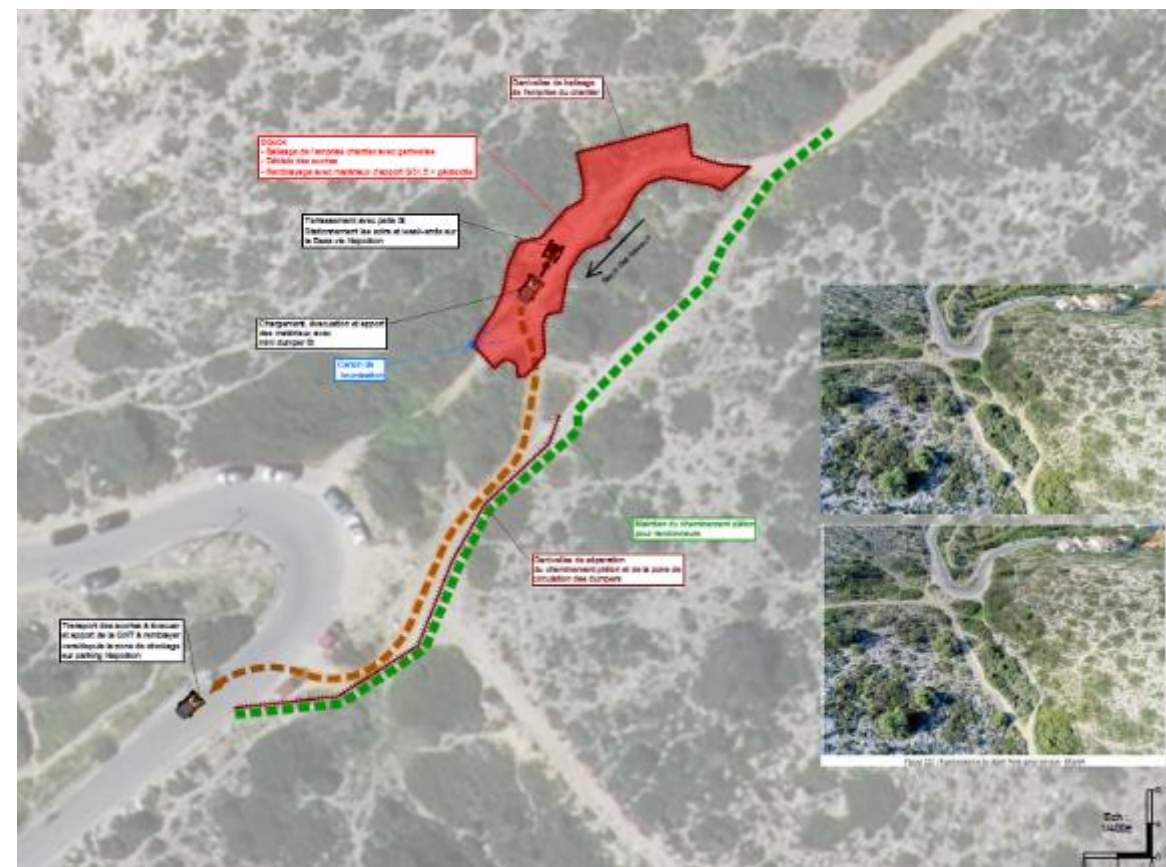

Port des Goudes : dépôts DGo01 - 02



Port des Goudes : dépôts DGo01 - 02

- **Travaux prévus du 01/11/2026 au 01/03/2027**
- **Retalutage**, confinement et mise en place d'**enrochements massifs**



- **Environ 150 camions** : important apport de matériaux nécessaire (environ 1400 m³ de blocs calcaires)
- **Accès maintenu pour les cabanoniers**
- **Référé préventif sur les habitations** situées à proximité immédiate

Port des Goudes : dépôts DGo01 - 02



Etat initial



Après travaux

Anse de la Maronaise: dépôt DGo05



Anse de la Maronaise : dépôt DGo05

- **Travaux prévus : du 06/11/2026 au 12/01/2027**
- **Purge intégrale du dépôt :**
évacuation d'environ 1000 t de scories et déchets amiantés
- 60 camions environ



Entrée des Goudes : dépôt DGo03



Entrée des Goudes : dépôt DGo03

- **Travaux prévus du 15/10/2026 au 01/03/2027**
- **Confinement avec mur perré** et reprise du soutènement routier
- 20 à 30 camions environ



- **Alternat de circulation** nécessaire pendant toute la durée des travaux (retrait possible les week-ends)
- Nécessité de **déplacer l'arrêt de bus**
- **Référé préventif sur les habitations** situées à proximité immédiate

Entrée des Goudes : dépôt DGo03



Etat initial




Après travaux

Vallon de l'Escalette : dépôts DVEs01 - 04



Vallon de l'Escalette : dépôts DVEs01 - 04

- Travaux prévus du 01/10/2026 au 15/02/2027
- Retalutage et confinement avec un habillage en éboulis calcaire

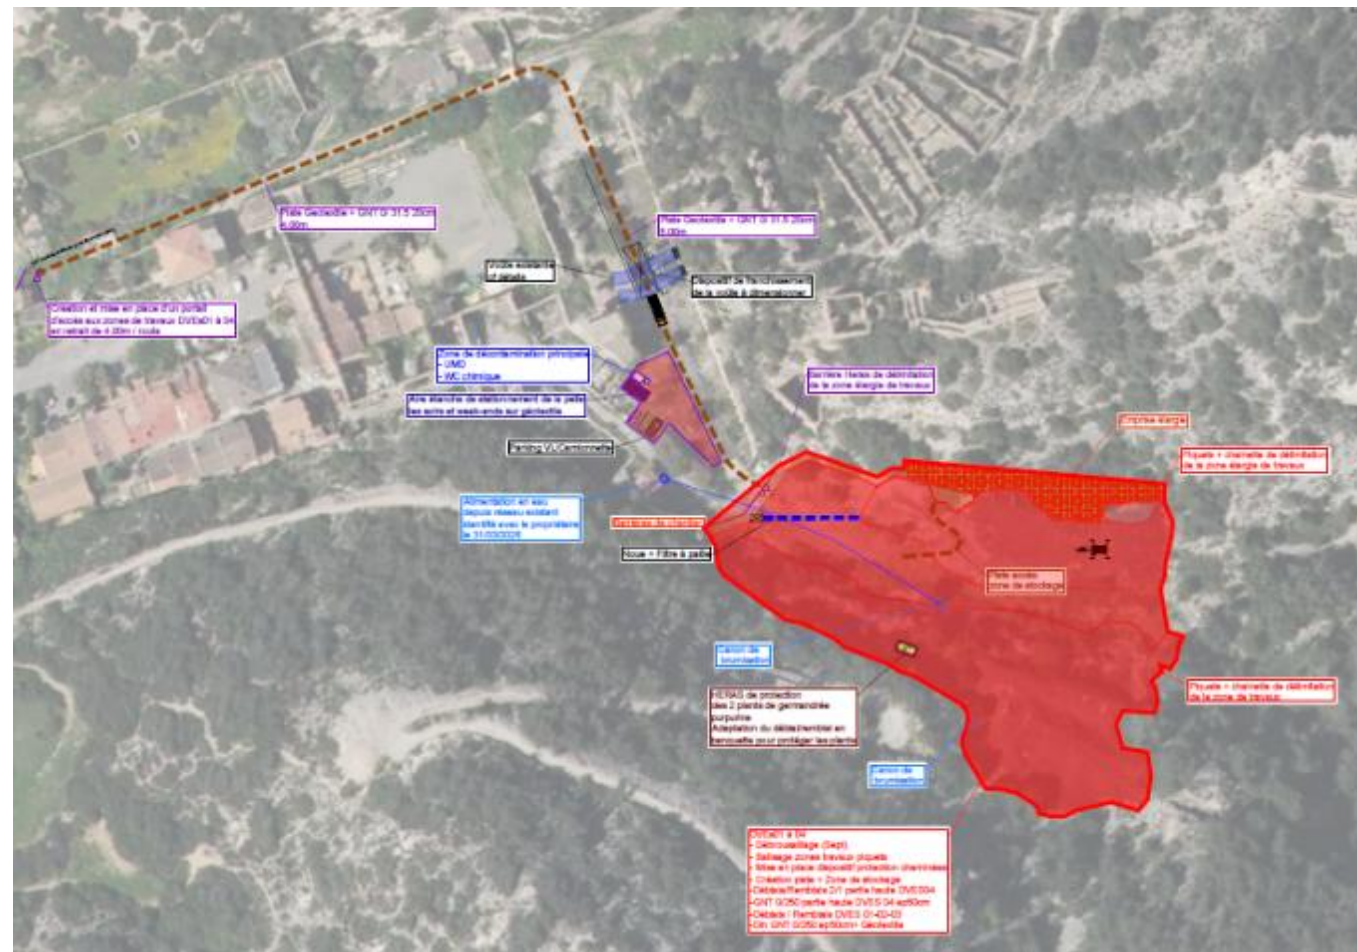

Important apport de matériaux calcaires nécessaire (environ 2500 m³) → environ **350 camions**

Vallon de l'Escalette : dépôts DVEs01 - 04



Etat initial



Après travaux

Modalités pratiques

Présentation des mesures d'accompagnement

Secteur	Nbr. de places avant travaux (environ)	Nombre de places résiduelles (environ)
Saména (15 sept. 2026 - Fin Janv. 2027)	5	0
Mauvais Pas	15	15
Escalette (1 ^{er} sept. 2026 - Fin mars 2027)	55 - 65	15
Calanque Blanche (15 sept. 2026 – Fin janv. 2027)	35	25
Les Goudes	130	120
- Port des Goudes (1 ^{er} nov 2026 - Fin février 2027)	18	0
- Sortie des Goudes vers Callelongue	20	20
Parking Napoléon	100 - 120	14 uniquement les week-ends 0 en semaine
Zone de délestage Napoléon 2		100
Callelongue (15 sept 2026 – Fin mars 2027)	65 - 70	16
- Nord Livanos	10 - 15	0
- Livanos	30	0
- Entrée de Callelongue	16	16

Goudes - Modalités pratiques



- **Mise en place d'un alternat de circulation** à l'entrée des Goudes, au niveau de l'arrêt de bus Roche Blanche
- **Circulation accrue de camions** pendant la durée des travaux. Les passages seront encadrés par des agents de chantier afin de sécuriser les déplacements
- **Suppression temporaire de places de stationnement** rue Pelaprat (entre les rues du Chasseur et des Égoutiers), du **15 novembre 2026 au 1er mars 2027**, afin de faciliter la circulation des engins de chantier

Callelongue – Modalités pratiques

- **Mise en place d'un alternat permanent pendant 7 mois**, avec un barriérage continue incluant le rond-point Livanos (maintien du dispositif les week-ends)
- **Adaptation du rond-point Livanos** afin de permettre le passage des engins de chantier (protection du rond-point et dépose temporaire des panneaux et des plots)
- **Dépose temporaire des arceaux à vélos et stations Le Vélo** situés dans l'emprise du chantier
- **Déplacement de la guérite et de la barrière de filtrage** des accès à Callelongue vers le parking Napoléon, accompagné de la création d'un demi-giratoire (ADEME)
- **Fonctionnement de la barrière (Ville) :**
 - samedi et dimanche entre 7 h et 19 h (période septembre octobre hors vacances scolaires)
 - samedi, dimanche et jour férié entre 9 h et 18 h (période entre novembre 2026 et 31 mars 2027)
 - tous les jours de 9 h à 18 h (période des vacances scolaires)

Modalité pratiques diverses

- **Installation de chantier à partir du 01/09/2026, avec un démarrage effectif des travaux le 15/09/2026** (pas de démarrage différé possible)
- **Afin de sécuriser le planning** annoncé par les entreprises :
 - ✓ **Extensions des horaires** de travail de **6 h à 20 h**, de septembre à décembre, afin de profiter de la lumière naturelle
 - ✓ Possibilités de réaliser des **travaux de sculpture le samedi à Callelongue**. Ces opérations ne génèrent **pas de nuisance sonore**

Mobilité douce

- Maintien des arceaux à vélo et stations « Le Vélo » sauf ceux situés à Callelongue

Merci de votre attention

Contacts ADEME jusqu'au 27 septembre 2026 :

Jean-Marc BONZOM : jean-marc.bonzom@ademe.fr

Jean-Rémi PRESTINI : jean-remi.prestini@ademe.fr

Guillaume MASSELOT : guillaume.masselot@ademe.fr

A partir du 28 septembre : Melody GROS : melody.gros@ademe.fr

- ***Un site internet pour être informé :*** <https://calanques-de-marseille.ademe.fr/>
